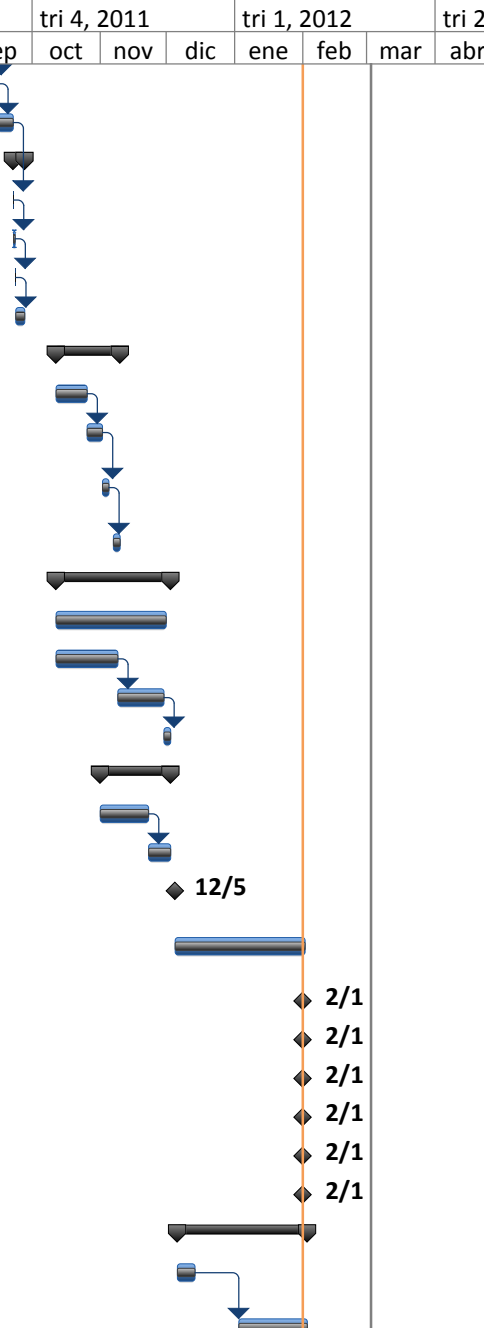


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2011				tri 4, 2011				tri 1, 2012			tri 2, 2012
							jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	
1			Migración de los Datos Catastrales	15 días	vie 7/15/11	jue 8/4/11												
2			Migración de los Datos Catastrales	15 días	vie 7/15/11	jue 8/4/11												
3			Diseño Web	10 días	vie 7/15/11	jue 7/28/11												
4			Estilos de Formulario(CSS)	40 horas	vie 7/15/11	jue 7/21/11												
5			Estilos de Menú y Pagina Principal	40 horas	vie 7/22/11	jue 7/28/11												
6			Sistema Administrativo	8.31 días	vie 7/15/11	mié 7/27/11												
7			Gestión de Cargo	3.5 horas	vie 7/15/11	vie 7/15/11												
8			Gestión de Departamento	3.5 horas	vie 7/15/11	vie 7/15/11												
9			Gestión de Usuario	3.5 horas	mié 7/20/11	jue 7/21/11												
10			Gestión de Formulario	3.5 horas	mar 7/26/11	mar 7/26/11												
11			Gestión de Permisos	3.5 horas	mar 7/26/11	mié 7/27/11												
12			Sistema Territorial-Catastral	92.69 días	mié 7/27/11	vie 12/2/11												
13			Catastro	25.94 días	mié 7/27/11	jue 9/1/11												
14			Gestión de Catastro	3.5 horas	mié 7/27/11	mié 7/27/11												
15			Gestión de Parroquia	3.5 horas	mié 7/27/11	jue 7/28/11												
16			Gestión de Barrio	3.5 horas	jue 7/28/11	jue 7/28/11												
17			Gestión de Zona	3.5 horas	jue 7/28/11	vie 7/29/11												
18			Gestión de Notaria	3.5 horas	vie 7/29/11	vie 7/29/11												
19			Gestión de Notario	3.5 horas	vie 7/29/11	vie 7/29/11												
20			Gestión Característica	3.5 horas	vie 7/29/11	lun 8/1/11												
21			Gestión de Pendiente de Terreno	3.5 horas	lun 8/1/11	lun 8/1/11												
22			Gestión de Lindero	4 horas	lun 8/1/11	mar 8/2/11												
23			Gestión de Tenencia de Terreno	4 horas	mar 8/2/11	mar 8/2/11												
24			Gestión de Modo	3.5 horas	mar 8/2/11	mié 8/3/11												
25			Gestión Propietario	40 horas	mié 8/3/11	mié 8/10/11												
26			Gestión de Lote	80 horas	mié 8/10/11	mié 8/24/11												
27			Gestión de Imágenes del Lote	40 horas	mié 8/24/11	mié 8/31/11												
28			Gestión de Documento del Lote	8 horas	mié 8/31/11	jue 9/1/11												
29			Construcciones	7 días	jue 9/1/11	lun 9/12/11												
30			Gestión de Formas Constructivas	24 horas	jue 9/1/11	mar 9/6/11												
31			Gestión de Bloque	16 horas	mar 9/6/11	jue 9/8/11												
32			Gestión de Piso	16 horas	jue 9/8/11	lun 9/12/11												
33			Avalúos	8 días	lun 9/12/11	jue 9/22/11												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2011				tri 4, 2011			tri 1, 2012			tri 2, 2012	
							jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	
34			Gestión de Avalúos de Manzanas	24 horas	lun 9/12/11	jue 9/15/11												
35			Gestión de Avalúos de Lote	40 horas	jue 9/15/11	jue 9/22/11												
36			Mejoras	3.31 días	jue 9/22/11	mar 9/27/11												
37			Gestión de Vías	3.5 horas	jue 9/22/11	jue 9/22/11												
38			Gestión de Contratos	3.5 horas	jue 9/22/11	vie 9/23/11												
39			Gestión de Obras	3.5 horas	vie 9/23/11	vie 9/23/11												
40			Asignar Obras a Predios	16 horas	vie 9/23/11	mar 9/27/11												
41			Coactivas	21 días	mié 10/12/11	mié 11/9/11												
42			Gestión de Abogados	10 días	mié 10/12/11	mar 10/25/11												
43			Asignar Costas Judiciales a los precios	5 días	mié 10/26/11	mar 11/1/11												
44			Asignar Abogados a las costas judiciales	3 días	mié 11/2/11	vie 11/4/11												
45			Emisión de Notificaciones	3 días	lun 11/7/11	mié 11/9/11												
46			Recaudación	38 días	mié 10/12/11	vie 12/2/11												
47			Migración de Deuda de Abonados	36 días	mié 10/12/11	mié 11/30/11												
48			Recaudación de Lotes	20 días	mié 10/12/11	mar 11/8/11												
49			Reintegro de Títulos Prediales	15 días	mié 11/9/11	mar 11/29/11												
50			Recaudación de Rentas	3 días	mié 11/30/11	vie 12/2/11												
51			Gestión de Emisión	24 días	mar 11/1/11	vie 12/2/11												
52			Gestión de Preemisión	16 días	mar 11/1/11	mar 11/22/11												
53			Emisión	8 días	mié 11/23/11	vie 12/2/11												
54			Inicio de Implementación del Sistema Territorial-Catastral	0 días	lun 12/5/11	lun 12/5/11									12/5			
55			Capacitación del Sistema Territorial-Catastral	43 días	lun 12/5/11	mié 2/1/12												
56			Informes	0 días	mié 2/1/12	mié 2/1/12										2/1		
57			Manual Técnico del Sistema	0 días	mié 2/1/12	mié 2/1/12										2/1		
58			Manual de Instalación	0 días	mié 2/1/12	mié 2/1/12									2/1			
59			Manual de Configuración	0 días	mié 2/1/12	mié 2/1/12									2/1			
60			Manual de Usuario	0 días	mié 2/1/12	mié 2/1/12									2/1			
61			Código Fuente	0 días	mié 2/1/12	mié 2/1/12									2/1			
62			Sistema de Información Geográfica	43 días	mar 12/6/11	jue 2/2/12												
63			Migración de las Capas Geográficas del GAD de Manta	6 días	mar 12/6/11	mar 12/13/11												
64			Visor de Capas	23 días	mar 1/3/12	jue 2/2/12												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		tri 3, 2011				tri 4, 2011			tri 1, 2012			tri 2, 2012
							jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	
65			BI	23 días	mar 1/3/12	jue 2/2/12												
66			Implementación del Sistema Geográfico	20 días	mié 2/1/12	mar 2/28/12												
67			Implementación BI	20 días	mié 2/1/12	mar 2/28/12												
68			Informe final de la Implementación y Capacitación	0 días	vie 3/2/12	vie 3/2/12										 3/2		
